

山东金号家纺集团有限公司家纺工业园项目（一期） 竣工环境保护验收其它需要说明的事项

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2019年1月24日，山东金号家纺集团有限公司在聊城市茌平县组织召开了家纺工业园项目（一期）竣工环境保护验收会议。会前，验收组对项目环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查。现将该工程环境保护设施设计施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况以及整改工作情况等，列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计、施工简况

山东金号家纺集团有限公司将环境保护设施纳入了设计、施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，经调查，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.2 验收过程简况

项目于2018年4月竣工，2018年8月建设单位委托山东德达环境科技有限公司承担本工程的验收报告编制工作，委托山东省分析测试中心承担验收监测工作。2019年1月，山东德达环境科技有限公司编制完成《山东金号家纺集团有限公司家纺工业园项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，2019年1月24日组织召开竣工环境保护验收会议，由环评单位、环保设施设计施工单位和3名专家等验收组人员提出了验收意见。

验收意见的结论：山东金号家纺集团有限公司家纺工业园项目（一期）基本落实了环评批复中的各项环保要求，污染物达标排放，主要污染物满

足总量控制指标要求，已取得排污许可证，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

根据环境保护管理制度，企业设置了环保科负责全厂环境保护工作，设科长 1 名，环保主管 2 名，协助科长负责厂区的环境管理。

表 1 环保规章制度设置情况

序号	环保规章制度	主要内容
1	环保工作管理办法	公司日常环境保护工作的管理
2	污水处理站作业指导及交接班制度	操作规程管理、工艺记录管理、辅料消耗管理、交接流程等
3	污水处理站设备维护卫生清洁管理制度	污水处理站设备维护、卫生清洁工作的管理
4	危险废物污染环境防治责任制度	明确分管人员的责任，确保环保工作的决策、监督和协调。
5	危险废物管理制度	危险废物的管理、控制、运输和处置。
6	危险废物安全操作规程	危废装卸搬运过程控制管理
7	危险废物交接管理办法	规范危废交接手续和管理台账的管理

(2) 环境风险防范措施

2016 年 12 月委托济南绿帆节能环保科技有限公司编制了《山东金号织业有限公司（工业园区）突发环境事件应急预案》，并于 2017 年 1 月 20 日在当地环保局备案，具有备案文件，备案编号为 371523-2017-007-L。应急预案在环境应急资源调查内容中明确了区域应急联动方案，并按照预案定期进行演练。

(3) 环境监测计划

目前已经委托聊城市环境科学工程设计院环境检测中心定期监测，包括废水、废气、噪声和污泥的监测，监测结果均能够满足相关标准要求；但需根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）中相关要求及环评要求，进一步完善监测计划，增加废水中悬浮物、色度的监测和雨水排放口化学需氧量、悬浮物的监测，增加有组织废气的监测（恶臭、割绒棉尘）；做好运营期环境监测工作，确保污染物长期、稳定达标排放。

2.2 配套措施落实情况

(1) 淘汰落后产能

根据环评及批复要求已拆除现有南厂区 6 套落后的绞纱染设施（代之以 4 套筒染设施），启动现有南、北厂区有机产品生产，拆除 5 套溢流染设备（见下图验收意见表）。

企业淘汰落后产能验收意见表						
企业名称	山东金号纺织有限公司		企业地址	位干镇中心街 121 号		
法定代表人	刘光斌	联系电话	0635-4276584	传真	0535-4276037	
经营范围	针棉制品制造与销售		主要产品	毛巾类产品生产与销售		
淘汰落后产能任务	GMB-3 溢流机 (容量 300kg) 3 台 GMB-4 溢流机 (容量 400kg) 1 台 GMB-5 溢流机 (容量 140kg) 1 台 105310F 染色机 (容量 400kg) 4 台 YJ-1101 染色机 (容量 200kg) 2 台		实际淘汰落后产能	2304 万元		
企业基本情况 (上年度)						
职工人数	4142 人	固定资产净值	29483 万元	主营业务收入	197146 万元	
利润总额	19728 万元	其中: 利润	14463 万元			
涉及淘汰落后产能有关情况 (上年度)						
职工人数	4142 人	固定资产净值	29483 万元	主营业务收入	187146 万元	
利润总额	19728 万元	其中: 利润	14463 万元			
淘汰落后产能效果 (吨)	节能 (折标煤)	562 吨	减排	COD	3.75 吨	
				SO ₂	0 吨	
拆除设备或生产线名称						
名称	规格型号	数量	关停时间	拆除时间	最终去向	
溢流染色机	GMB-3 型 (容量 300kg)	3 台	2015 年 10 月	2015 年 11 月	拆除报废	
溢流染色机	GMB-2 型 (容量 400kg)	1 台	2015 年 10 月	2015 年 11 月	拆除报废	
溢流染色机	GMB-4 型 (容量 400kg)	1 台	2015 年 10 月	2015 年 11 月	拆除报废	
预纱染色机	105310F (容量 400kg)	4 台	2015 年 7 月	2015 年 10 月	拆除报废	
开门式染色机	YJ-1101 (容量 200kg)	2 台	2015 年 5 月	2015 年 10 月	拆除报废	
实施及完成情况 (企业填写)	计划 2015 年 11 月 31 日前完成 11 套染色机的淘汰, 从 2015 年 5 月开始实施, 到 2015 年 11 月底全部完成。 企业负责人 (签字)  (企业盖章)  年 月 日					
中 (部门) 初审意见	负责人签字:  (主管部门盖章)  2015 年 12 月 20 日					
审核意见	验收负责人 (签字)  (主管部门盖章)  年 月 日					

(2) 防护距离控制

环评要求厂界卫生防护距离为 100m；污水处理站的卫生防护距离为 200m。距离厂区最近的村庄是东封村，离厂界最近距离约 160m，离污水


处理站约 260m，因此本工程卫生防护距离范围内没有敏感的居民点。

3 整改工作情况

本项目主要在验收监测期间进行了环保设施整改，其他环节基本未进行整改工作。

2018 年 11 月，验收监测期间，本项目整改情况如下：



(1) 恶臭排气筒采样梯整改情况：

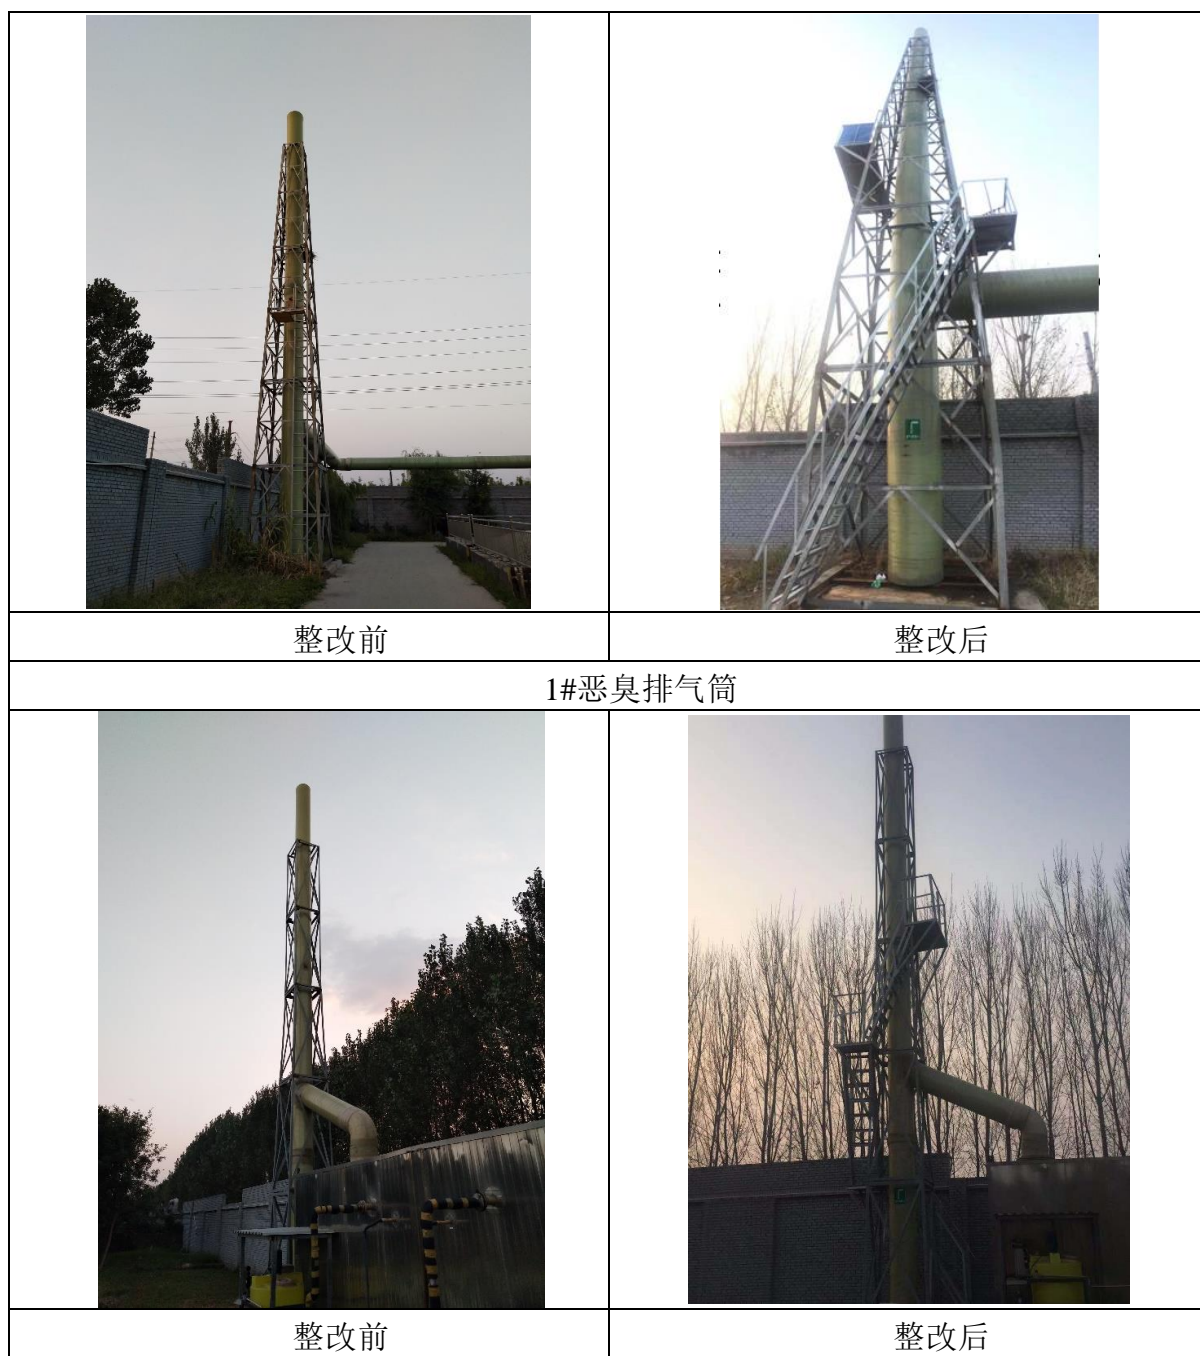

2#恶臭排气筒

(2) 针对废水总磷超标，企业采取源头削减和末端治理的措施，将原辅材料含磷的液蜡、精炼剂、皂洗剂更换为无磷的，污水处理过程添加除磷剂，来减少废水中的总磷含量。

(3) 企业在南厂界主要噪声源空压机房门口和窗口设置了隔音棉联，在西厂界主要噪声源污水处理站风机房门口和窗口分别设置了隔音棉联和隔音塑料布，整改情况如下：

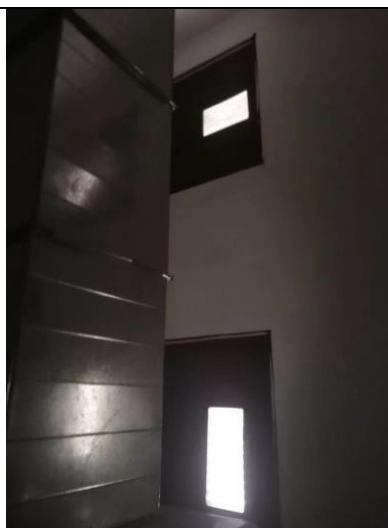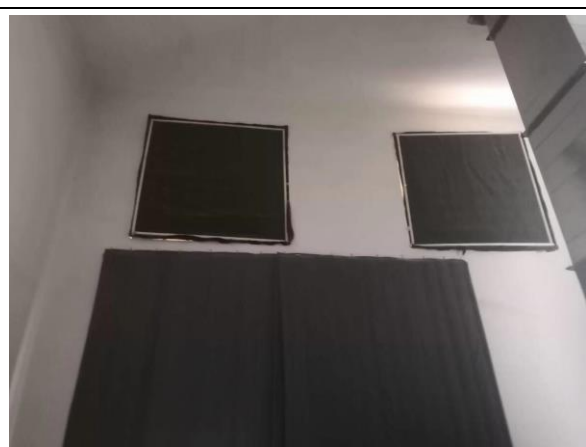

南厂界空压机房



西厂界污水处理站风机房

整改效果：

废水总磷可以满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2间接排放限值和《污水排入城镇下水道

水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级限值要求。

南厂界和西厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

山东金号家纺集团有限公司

2019年1月30日
